

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府
小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、
S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二
（非人防）及人防地下车库二）阶段性竣工环境
保护验收监测报告

建设单位：芜湖保颂房地产开发有限公司

编制单位：芜湖琅烨环境科技有限公司

二〇二五年十月

建设单位：芜湖保颂房地产开发有限公司

法人代表：邱宏刚

编制单位：芜湖琅烨环境科技有限公司

法人代表：吴俊

建设单位：芜湖保颂房地产开发有限公司

电话：/

传真：/

邮编：241000

地址：芜湖市弋江区马塘街道春江
明月一期 3 号楼 201-1 室

编制单位：芜湖琅烨环境科技有限公司

电话：/

传真：/

邮编：241000

地址：芜湖市弋江区鲁港街道高新
技术开发区服务外包产业园 8 号楼
210 室

声明

- 一、本报告不得自行涂改、增删，否则一律无效；
- 二、报告内容及监测数据仅对本次建设项目竣工环保验收监测负责。

目 录

1 验收项目概况	1
2 验收依据	3
2.1 法律、法规	3
2.2 验收技术规范	3
2.3 工程技术文件及批复文件	3
3 工程建设情况	4
3.1 项目基本情况	4
3.2 地理位置及平面布置	4
3.3 建设内容	8
3.4 水源及水平衡	12
3.5 工艺流程简介	12
3.6 项目变动情况	13
4 环境保护设施	14
4.1 污染物治理、处置设施	14
4.1.1 废水排放及防治措施	14
4.1.2 废气排放及防治措施	14
4.1.2.1 机动车尾气	14
4.1.2.2 餐饮油烟废气	14
4.1.2.3 恶臭污染源	15
4.1.3 噪声排放及防治措施	15
4.1.4 固体废弃物及其处置	16
4.2 其他环保措施	16
4.2.1 其他设施	16
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	16
5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	18
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	18

5.2 审批部门审批决定	18
6 验收检测评价标准	19
6.1 废水排放标准	19
6.2 厂界噪声评价标准	19
7 验收监测内容	20
7.1 环境保护设施调试效果	20
7.1.1 厂界噪声监测	20
8 质量保证及质量控制	21
8.1 质量保证体系	21
8.1.1 噪声监测质量控制	21
9 验收监测结果	22
9.1 生产工况	22
9.2 环境保护设施调试效果	22
9.2.1 厂界噪声监测结果与评价	22
10 环境管理检查	23
10.1 环保管理机构	23
10.2 施工期环境管理	23
10.3 运行期环境管理	23
10.4 环境管理情况分析	23
10.5 环评批复落实情况检查	23
11 验收监测结论	24
11.1 环境保护设施调试结果	24
11.2 结论	24
11.3 建议	25

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、
地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告

附图	
附图一	现场监测图
附图二	雨污管网图
附图三	环保设施图
附件	
附件一	委托书
附件二	立项备案表
附件三	排水许可证
附件四	规划许可证
附件五	检测报告

1 验收项目概况

芜湖保颂房地产开发有限公司在芜湖市弋江区建设“保利文华和颂府小区项目”，该项目东至新兴东路，南至规划道路（纬八路），西至规划用地，北至马仁山路。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环保法律法规的规定，芜湖保颂房地产开发有限公司于 2023 年 7 月 13 日完成建设项目立项备案工作，项目编号为：2307-340203-04-01-457494。项目于 2023 年 9 月开工建设，规划用地面积 173092.06m²，该地块由 A、B、C、D、E 五个地块组成。其中，A 地块为公园绿地，土地面积 31141.63m²；B 地块为居住用地，土地面积 65521.6m²，容积率 2.0；C 地块为道路用地，土地面积 25566.19m²；D 地块为教育用地，土地面积 38862.6m²，要求建设一个 36 班小学；E 地块为防护绿地，土地面积 12000.04m²。2025 年 3 月初建设完成其中 G1-3#、G5-6#住宅楼，Y1~Y2#、Y5#住宅楼，P2#~P3#公共设施楼及地下车库一，并于 2025 年 5 月完成竣工环境保护验收工作。

“保利文华和颂府小区项目”于 2025 年 8 月建设完成剩余规划建筑：G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二；根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环保设计文件和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2025 年 8 月底，芜湖保颂房地产开发有限公司委托芜湖琅烨环境科技有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告。我公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）有关要求，对该建设项目的主体工程、污染防治措施、污染物排放、环境管理及周边情况等内容进行了实地勘察，根据相关技术资料，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案，并委托安徽国晟检测技术有限公司于 2025 年 3 月 13 日~2025 年 3 月 14 日对现场噪声进行了竣工验收检测并出具检测报告。芜湖琅烨环境科技有限公司

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、
地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告
根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染
影响类》编制完成了竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）；
- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日起施行）；
- （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）；
- （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日施行）；
- （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）；
- （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日起施行）；
- （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起施行）；
- （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。

2.2 验收技术规范

- （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
- （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
- （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；
- （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
- （5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改清单；
- （6）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
- （7）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
- （8）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
- （9）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；
- （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
- （11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
- （12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

2.3 工程技术文件及批复文件

- （1）验收楼栋规划许可证；
- （2）建设项目备案表，2023 年 7 月 13 日；
- （3）芜湖保颂房地产开发有限公司提供的工程竣工资料等其他相关资料。

3 工程建设情况

3.1 项目基本情况

建设项目基本情况详见表 3-1 所示。

表 3-1 建设项目基本信息

建设项目名称	保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）		
建设单位名称	芜湖保颂房地产开发有限公司		
建设项目性质	新建		
建设项目地点	芜湖市弋江区，东至新兴东路，南至规划道路（纬八路），西至规划用地，北至马仁山路		
立项	/		
环评登记表编制单位	/	环评登记表审批部门	/
开工建设时间	2023.9	投入试生产时间	2025.8
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/
工程总投资概算（万元）	179000	环保投资概算（万元）	2000
工程实际总投资（万元）	110000	环保投资概算（万元）	1300
建设规模	项目占地面积 173092.06m ² ，总建筑面积约 151199.7m ² ，建设住宅、商服及配套公共设施楼；配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等设施。		
现场勘查时工程实际建设情况	项目占地面积 173092.06m ² ，验收建成建筑面积约 94371.43m ² ；主要建成 3 栋高层住宅楼、7 栋洋房、1 栋公共服务楼及三处地下车库，配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等设施。		

3.2 地理位置及平面布置

“保利文华和颂府小区项目”，该项目位于芜湖市弋江区，东至新兴东路，南至规划道路（纬八路），西至规划用地，北至马仁山路。

项目实际共建成 1 栋 18F 住宅楼、2 栋 22F 住宅楼、1 栋 10F 洋房，6 栋 11F 洋房，1 栋 1F 公共设施楼及 3 处-1 地下车库；总建筑面积 94371.43m²，其中住宅面积 66799.81m²，配套商业用房面积 546.48m²，配电房面积 166.05m²，物业管理用房面积 517.08m²，消防控制室面积 60.78m²，地下车库面积 26281.23m²；配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等配套设施。该项目未设置卫生防护距离。

建设项目地理位置见图 3-1，项目周边环境概况图见图 3-2，平面布置图见图 3-3 所示。

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工
环境保护验收监测报告

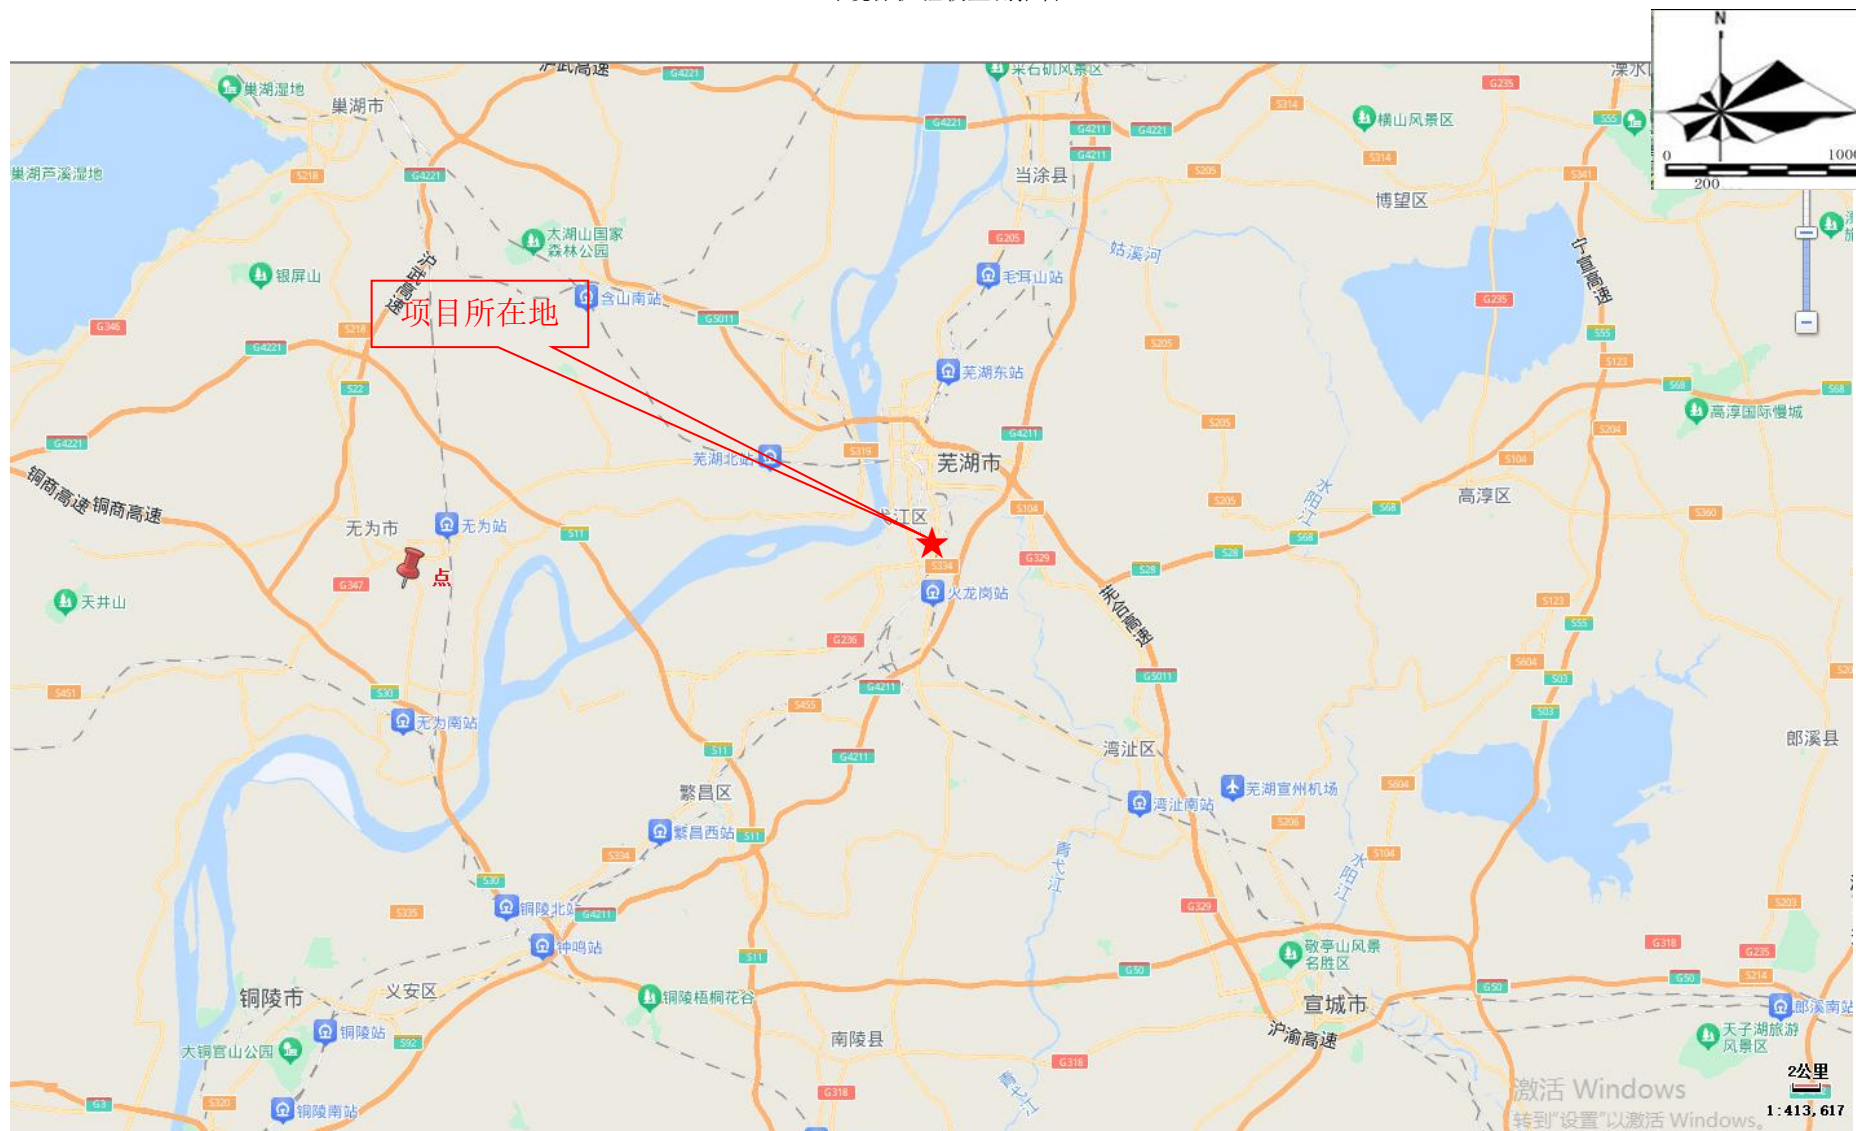


图 3-1 项目地理位置图

6

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工
环境保护验收监测报告

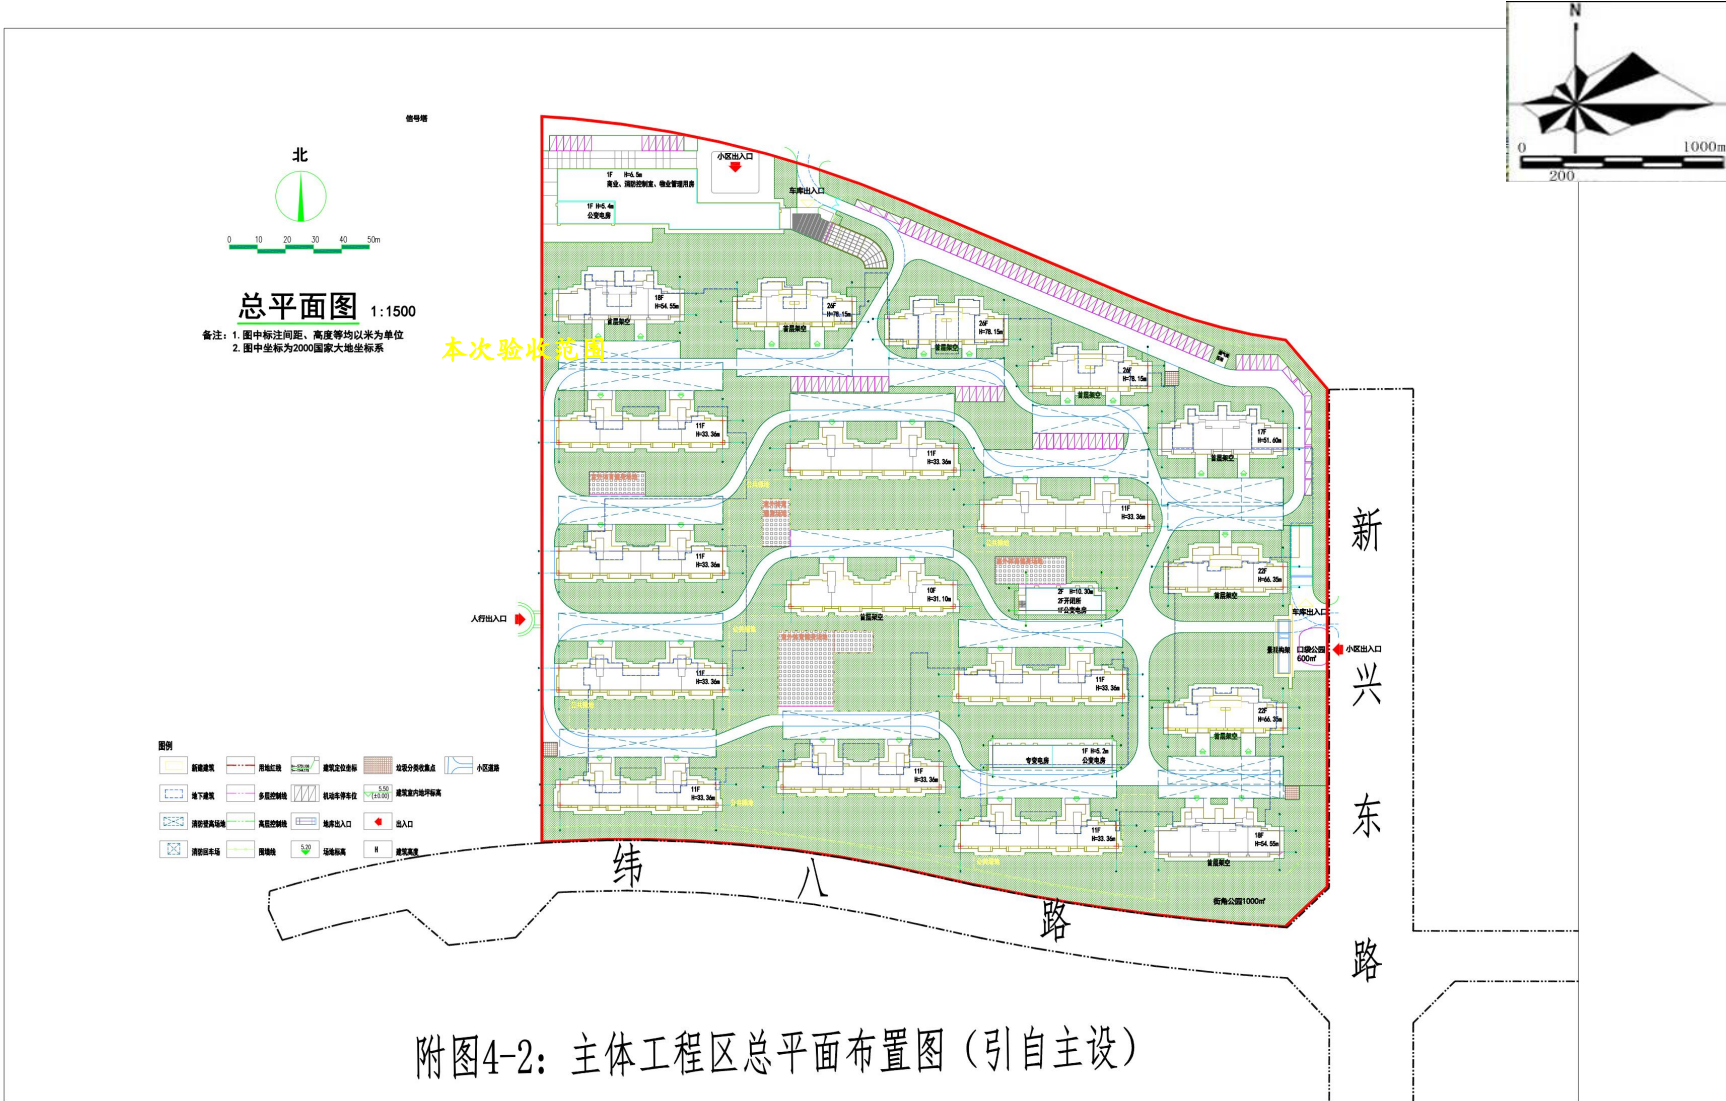


图 3-3 项目总平面布置图

3.3 建设内容

芜湖保颂房地产开发有限公司“保利文华和颂府小区项目”设计占地面积 173092.06m²，总建筑面积约 151199.7m²；目前实际共建成 1 栋 18F 住宅楼、2 栋 22F 住宅楼、1 栋 10F 洋房，6 栋 11F 洋房，1 栋 1F 公共设施楼及 3 处-1 地下车库；总建筑面积 94371.43m²，其中住宅面积 66799.81m²，配套商业用房面积 546.48m²，配电房面积 166.05m²，物业管理用房面积 517.08m²，消防控制室面积 60.78m²，地下车库面积 26281.23m²；配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等配套设施。该项目未设置卫生防护距离。暂无居民入住。

本次验收部分主要经济技术指标如表 3-2 所示。

表 3-2 项目主要经济技术指标

项目		单位	立项设计	规划设计	本次建设
			指标		
总用地面积		m ²	173092.06	173092.06	173092.06
总建筑面积		m ²	151199.7	151199.7	94371.43
计容建筑面积		m ²	/	/	/
其中	住宅建筑面积		m ²	/	66799.81
	其中	社区居委会	m ²	/	0
		物业管理用房	m ²	/	517.08
		社区养老	m ²	/	0
		未成年人用房	m ²	/	0
		电视机房	m ²	/	0
		开闭所	m ²	/	0
		消防控制室	m ²	/	60.78
		配电房	m ²	/	166.05
	商业用房		m ²	/	546.48
	地下车库		m ²	/	26281.23
容积率		/	2.0	2.0	2.0
建筑密度		%	19.53	19.53	19.53
绿地率		%	35.01	35.01	35.01
居住户（套）数		户	/	/	/
居住人数		人	/	/	/
机动车停车		个	/	/	/
其中	地面停车		个	/	/
	地下停车		个	/	/
非机动车		个	/	/	/

“保利文华和颂府小区项目”，该项目位于芜湖市弋江区，东至新兴东路，南至规划道路（纬八路），西至规划用地，北至马仁山路。目前实际共建成 1 栋 18F 住宅楼、2 栋 22F 住宅楼、1 栋 10F 洋房，6 栋 11F 洋房，1 栋 1F 公共设施楼及 3 处-1 地下车库；总建筑面积 94371.43m²，其中住宅面积 66799.81m²，配套商业用房面积

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告

546.48m²，配电房面积 166.05m²，物业管理用房面积 517.08m²，消防控制室面积 60.78m²，地下车库面积 26281.23m²；配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等配套设施。该项目未设置卫生防护距离。暂无居民入住。

本项目环评工程设计和实际建设内容见表 3-3 所示。

表 3-3 工程设计和实际建设内容一览表

类别	名称	立项设计情况	规划工程内容及规模	验收建设情况
主体工程	住宅	项目占地面积 173092.06m ² ，总建筑面积 151199.7m ² ，建设 10 栋 11F 小高层，3 栋 17-18F 的中高层，2 栋 22F、3 栋 26F 大高层及 2 栋 1-2F 的配套建筑。	项目占地面积 173092.06m ² ，总建筑面积 151199.7m ² ，建设 10 栋 11F 小高层，3 栋 17-18F 的中高层，2 栋 22F、3 栋 26F 大高层及 2 栋 1-2F 的配套建筑。	项目占地面积 173092.06 万 m ² ，共建设 1 栋 18F 住宅楼、2 栋 22F 住宅楼、1 栋 10F 洋房，6 栋 11F 洋房，住宅建筑面积 66799.81m ² 。
	商业服务	/	/	1F，位于 S1P1#楼，建筑面积 546.48m ² 。
配套工程	配电房	/	/	1F，位于 S1P1#楼，建筑面积 166.05m ² 。
	开闭所	/	/	已验收
公用工程	供水系统	/	/	采用市政自来水为供水水源，由市政管网直接供水。
	排水系统	/	/	雨污分流制，雨水经雨水管道收集至市政雨水管网。生活污水经化粪池、商业地块含油废水经隔油池处理后排入市政污水管网。
	空调系统	/	/	项目住宅以及商业区均采用分体式空调设置。
	供气系统	/	/	市政燃气管道，依托市政燃气调压站。
	消防	/	/	中间留有隐形消防车道和消防登高操作台，住宅区北侧也有消防登高操作台。
	供电	/	/	市政供电管网，项目区内设有 1 座开闭所、2 处配电房，分别位于 P2#、P3#公共设施楼。
环保工程	油烟净化	地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口位于绿化带中。其中商业用房留有专用烟道，本项目从事餐饮业，餐饮油烟根据餐饮单位规模的不同，选择不同净化效率的油烟净化器，餐饮油烟经油烟净化器处理达到《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应规模限值后，通过专用烟道通往建筑物楼顶高空排放。	地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口位于绿化带中。其中商业用房留有专用烟道，本项目从事餐饮业，餐饮油烟根据餐饮单位规模的不同，选择不同净化效率的油烟净化器，餐饮油烟经油烟净化器处理达到《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应规模限值后，通过专用烟道通往建筑物楼顶高空排放。	地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口位于绿化带中。其中商业用房留有专用烟道，本项目从事餐饮业，餐饮油烟根据餐饮单位规模的不同，选择不同净化效率的油烟净化器，餐饮油烟经油烟净化器处理达到《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应规模限值后，通过专用烟道通往建筑物楼顶高空排放。
	废水治理	雨、污分流，污水集中排至化粪池、隔油池，预处理后排入市政污水管网，进入芜湖	雨、污分流，污水集中排至化粪池、隔油池，预处理后排入市政污水管网，进入芜湖市城	雨、污分流，污水集中排至化粪池、隔油池，预处理后排入市政污水管网，进入芜湖市城

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告

		湖市城南污水处理厂处理，达标后排入漳河。	南污水处理厂处理，达标后排入漳河。	南污水处理厂处理，达标后排入漳河。
固废治理		在商业区和住宅楼下设垃圾收集桶；生活垃圾经收集后，由环卫部门集中清运。	在商业区和住宅楼下设垃圾收集桶；生活垃圾经收集后，由环卫部门集中清运。	在商业区和住宅楼下设垃圾收集桶；生活垃圾经收集后，由环卫部门集中清运。
噪声治理		配电房、开闭所：选用加工精度高、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的隔声基础上。	配电房、开闭所：选用加工精度高、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的隔声基础上。	配电房、开闭所：选用加工精度高、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的隔声基础上。
		交通噪声：加强管理，设置禁止鸣喇叭，限速行驶标志等。	交通噪声：加强管理，设置禁止鸣喇叭，限速行驶标志等。	交通噪声：加强管理，设置禁止鸣喇叭，限速行驶标志等。
绿化率		绿地建设、景观改善等，项目绿地率 35.01%。	绿地建设、景观改善等，项目绿地率 35.01%。	绿地建设、景观改善等，项目绿地率 35.01%。

3.4 水源及水平衡

自来水来自区域自来水管网，验收部分目前尚未有住户入住，无用水量。

分市政及加压供水，加压供水分高、低区供水。商业配套为市政给水管网直接供给；住宅部分 1 至 8 层为低区，9 至 18 层为中层区，19 至 26 层为高层区，采用变频调速供水方式。高、中、低区用水由地下一层水泵房内生活水泵加压供水。高、中、低区均采用变频调速供水设备；为满足竖向分区最低卫生器具配水点静水压的要求，分别在高、低区内适当位置再布设支管减压阀减压；每套住宅设平衡式燃气热水器。

排水：小区排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管汇集后，排至项目东侧马仁山路的市政雨水管道内。项目废水经化粪池处理后通过马仁山路的市政污水管网，最终排入芜湖市城南污水处理厂进一步处理达标后排入漳河。本次验收住户尚未入住，因此本次验收尚无废水产生。

3.5 工艺流程简介

建设项目在建设过程中有基础工程、主体工程、装修工程等施工环节，污染影响时段分为施工期和运营期，其基本工序及产物环节见图 3-4 所示。

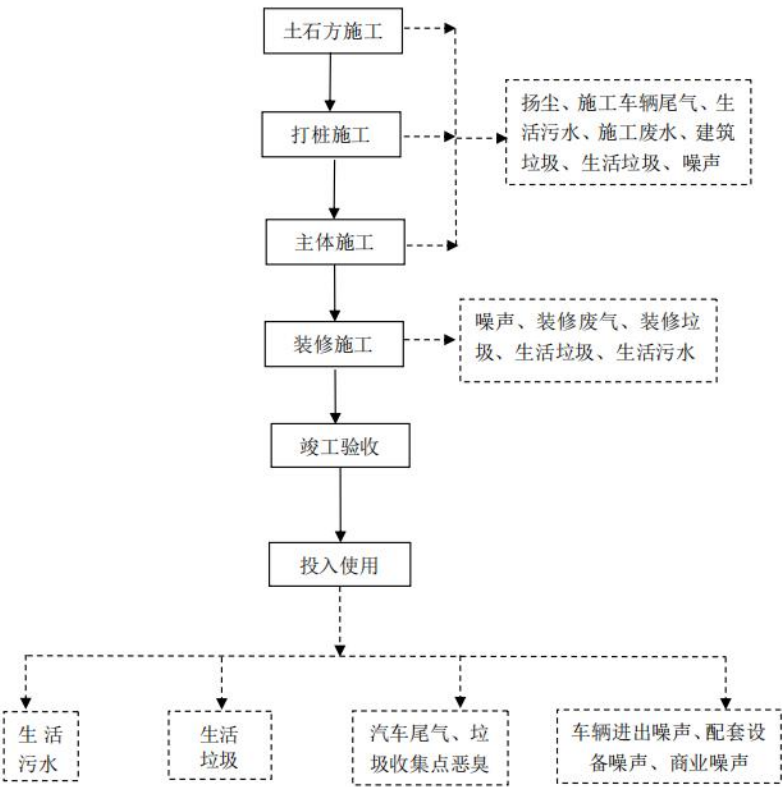


图 3-4 施工期、运营期工程工艺流程及产污节点图

工艺流程简介：

项目施工期主要分为土方开挖、基桩工程、结构施工、建筑施工等环节，待项目各建筑装修好后交付使用。

运营期主要有居民日常生活产生的污水、居民生活产生的厨房油烟、天然气燃烧废气、汽车尾气、生活垃圾、商业垃圾等。

3.6 项目变动情况

项目实际建设内容与立项备案与规划设计内容基本一致，不存在重大变动情况。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理、处置设施

4.1.1 废水排放及防治措施

“保利文华和颂府小区项目”已建成部分排水已实行“雨污分流”。项目废水主要为公建配套和居民生活产生的生活污水；雨水收集后排入项目区四周的市政雨水管网，生活污水经配套隔油池、化粪池预处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求排入马仁山路市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级中 A 标准后排入漳河。

本次验收住户尚未入住，无废水产生，待住户入住后，应落实废水监测。项目主要废水来源、污染因子、处置方式及排放去向见表 4-1 所示。

表 4-1 主要废水来源、污染因子、处置方式及排放去向

废水类别	来源	污染物	排放量	治理措施	排放去向
生活污水	住户生活用水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、动植物油	/	隔油池、化粪池	芜湖市城南污水处理厂

4.1.2 废气排放及防治措施

本项目废气主要来源于四个方面：其一是机动车尾气，其二是小区内居民的天然气燃烧废气，其三是厨房油烟，其四是垃圾收集点的恶臭气体。本项目现已建成，暂无居民入住，暂无废气产生。


4.1.2.1 机动车尾气

项目建有地下停车场、地面停车场。地面停车场及地面停车楼呈敞开式布置，采取自然通风。地下停车场为单层地下结构，单层设计高度为 3.5 米，地下车库设有机械通风及机械排烟系统。排风机出口设置在地下车库附近的地面集中绿化带中间，排放口高度为 2.5 米，每日换气次数不小于 6 次。

4.1.2.2 餐饮油烟废气

本项目建成入住后，由于住户日常使用天然气烹饪做饭，天然气燃烧会产生 SO₂、NO_x 等废气，天然气为国家鼓励使用的清洁能源，居民燃用天然气产生的废气经排油烟机作用后经烟道至楼顶高空排放，排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求，对大气环境影响较小。项目油烟由住户

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告
自行安装的油烟净化器处理后，与天然气燃烧废气一起经住房内预留烟道排入楼顶，高空排放。

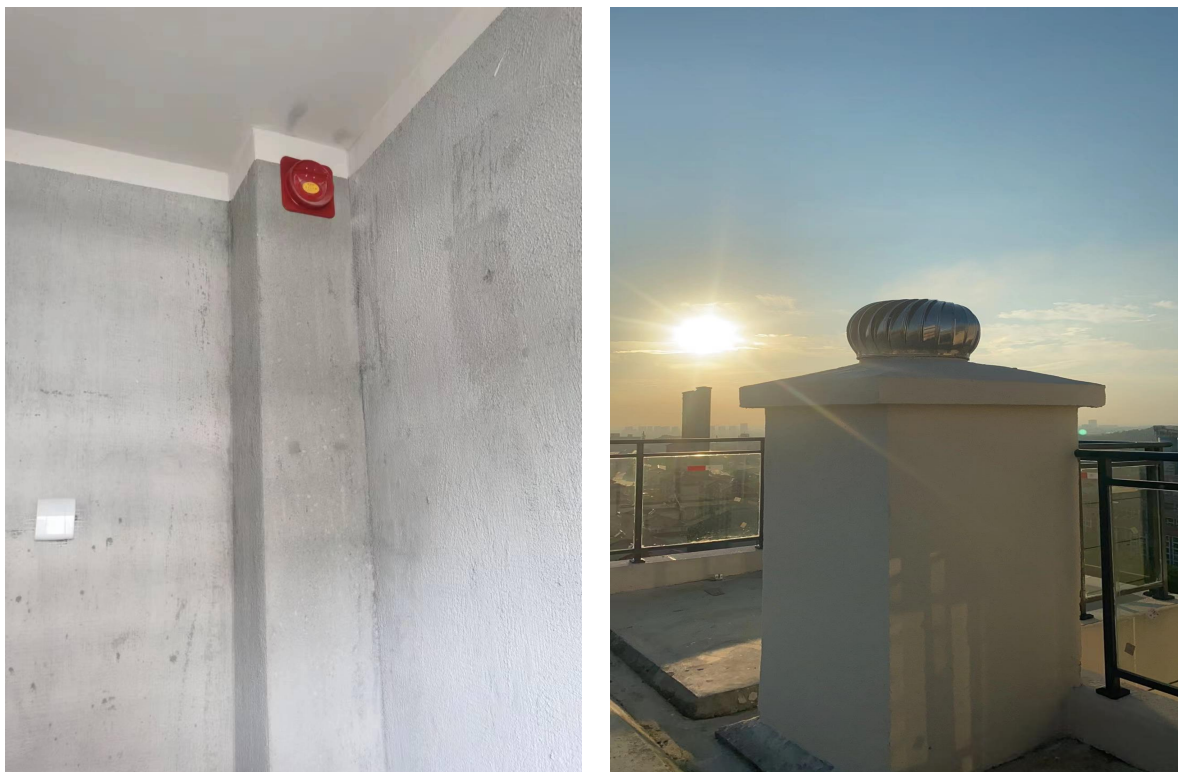

项目预留烟道

4.1.2.3 恶臭污染源

项目区未设垃圾中转站和集中垃圾收集点。项目产生的恶臭气体主要来自居民的生活垃圾收集桶产生的恶臭气体。每一个居民楼单元外设置一个垃圾收集桶。居民生活垃圾由环卫部门每天统一收集、外运至项目区外的垃圾中转站。项目产生的生活垃圾实行日产日清措施，不得在小区内停留超过 1 天。

4.1.3 噪声排放及防治措施

建设项目噪声主要来自配电房、通风机、泵机、配套公建区人员流动产生的社会噪声等。本项目在满足功能要求的前提下，变电设备等均选用加工精度高、装配质量好、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的隔声基础上，风机进风口加装消声百叶窗。紧邻交通主干道一侧应选择种植适宜树种，形成绿化缓冲林带，以减轻交通、商用设备噪声、振动对项目区域内办公场所的影响。同时，设备房位于地上，经过建筑物隔离。

本项目工程现已建成，暂无人员入住，入住后居民活动产生噪声对外环境影响较小。



小区绿化

4.1.4 固体废弃物及其处置

项目固废主要为居户的生活垃圾、商业及公建配套垃圾等。对这些垃圾实行袋装、分类收集，交环卫部门及时清运、日产日清；废包装材料等有用部分出售给专业收购人员综合利用。

本项目工程现已建成，暂无人员入住，无生活垃圾等固体废物产生。

4.2 其他环保措施

4.2.1 其他设施

1、施工期针对产生的噪声及粉尘，在施工项目周界安装噪声及粉尘实时监测系统，严格控制噪声及粉尘的排放。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资 110000 万元，其中实际环保投资 1300 万元，约占总投资的 1.181%。本项目环保设施已和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

环保设施投资及“三同时”落实情况见表 4-2 所示。

表 4-2 项目环保设施投资及“三同时”落实情况表

工程阶段	项目	污染物	污染治理设施名称	环保投资（万元）
营运期	废气治理	汽车废气	地下室竖向排烟井、排风系统	100
		居民油烟	厨房油烟预留内置烟道，引至楼顶排放	400
		商铺餐饮油烟	通过专用烟道通往建筑物楼顶高空排放。	20
	污水处理	生活污水	户外管网和接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，设	200

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G7-9#楼、Y3#楼、Y6-Y11#楼、S1P1#楼、地下车库一（非人防）、地下车库二（非人防）及人防地下车库二）竣工环境保护验收监测报告

			化粪池、隔油池，并做好防渗措施。	
	噪声治理	地下车库风机房	设置减震降噪装置，同时排风口安装消声器及消声百叶窗。	300
		配电房、开闭所	选用加工精度高、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减震垫的隔声基础上。	50
		交通噪声	加强管理，设置禁止鸣笛、限速行驶等标识。	50
	垃圾收集	生活垃圾	密闭式垃圾收集桶。	60
	绿化	生态环境	绿地建设、景观改善等，项目绿地率 35.87%。	120
合计				1300

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于其中“三十六、房地产”，“106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的“不涉及环境敏感区”的，无需开展环境影响评价工作。

5.2 审批部门审批决定

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于其中“三十六、房地产”，“106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的“不涉及环境敏感区”的，无需开展环境影响评价工作。

6 验收检测评价标准

6.1 废水排放标准

“保利文华和颂府小区项目”本次建成内容排水已实行“雨污分流”。项目废水主要为公建配套和居民生活产生的生活污水；雨水收集后排入项目区四周的市政雨水管网，生活污水经配套化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求排入马仁山路市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级中 A 标准后排入漳河。

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 的三级排放标准，见表 6-1 所示。

表 6-1 项目废水排放标准限值 单位：mg/L（除 pH）

污染物名称	排放标准（mg/L）	备注
pH	6~9	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表 4 中三级标准
COD	500	
SS	400	
BOD ₅	300	
动植物油	100	
氨氮	/	

本项目尚无住户入住，暂无生活污水产生，无监测条件，本次验收未监测废水。待有住户入住且具备监测条件时，企业另行对废水实施监测。

6.2 厂界噪声评价标准

建设项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 2 类标准，具体标准限值见表 6-2 所示。

表 6-2 项目场界环境噪声排放标准值 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间	标准来源
2 类	60	50	《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）

7 验收监测内容

此次竣工验收监测是对“保利文华和颂府小区项目”环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。

7.1 环境保护设施调试效果

7.1.1 厂界噪声监测

根据声源分布和项目周边情况，本次噪声监测分别在“保利文华和颂府小区项目”东界、南界、西界、北界设置 4 个监测点。

监测项目和频次见表 7-1，噪声监测点位布设见图 7-1 所示。

表 7-1 场界噪声监测点位、项目和频次

监测点位	监测项目	监测频次
东场界外 1m，高 1.2m 处 N1	等效连续（A）声级	2 天，昼、夜各 1 次
西场界外 1m，高 1.2m 处 N2	等效连续（A）声级	2 天，昼、夜各 1 次
南场界外 1m，高 1.2m 处 N3	等效连续（A）声级	2 天，昼、夜各 1 次
北场界外 1m，高 1.2m 处 N4	等效连续（A）声级	2 天，昼、夜各 1 次



图 7-1 噪声监测点位图

8 质量保证及质量控制

8.1 质量保证体系

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范（废气、水和废水、噪声、质控部分）》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

- 1、生产处于正常。监测期间生产在大于（或等于）75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。
- 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- 3、监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。
- 4、监测数据严格实行三级审核制度。

8.1.1 噪声监测质量控制

测量仪器使用I型分析仪。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经 A 声级校准器校验，误差控制在±0.5 分贝以内。噪声监测质控结果见表 8-1、表 8-2 所示。

表 8-1 噪声监测质控结果一览表

项目	日期	仪器	声级校准 dB（A）				是否符合要求
			测量前	测量后	示值偏差	标准值	
噪声	2025 年 3 月 13 日	AWA5688 噪声仪	93.8	93.8	0.0	±0.5	是
	2025 年 3 月 14 日		93.8	93.8	0.0	±0.5	是

表 8-2 噪声监测设备一览表

设备名称	型号	出厂编号	证书编号	计量有效日期
多功能声级计	AWA5688	00315729	LX2024B-007771	2025/7/23
风速风向仪	PLC-16025	ZD21772	123BA240109089	2026/1/3
声校准器	AWA6022A	2021483	LX2025B-000498	2026/1/14

9 验收监测结果

安徽国晟检测技术有限公司于 2025 年 3 月 13 日~2025 年 3 月 14 日对噪声进行现场监测，并出具检测报告。

9.1 生产工况

本项目为非生产性项目，无生产工况。项目环保验收监测期间，各环保设施运行正常，符合验收监测条件。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 厂界噪声监测结果与评价

2025 年 3 月 13 日~2025 年 3 月 14 日各减噪设备及防护设施运行正常。项目验收监测期间，昼间最大噪声 57.7dB（A），夜间最大噪声 48.7dB（A）；项目四周噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准，噪声可达标排放。

厂界噪声监测结果见表 9-1 所示。

表 9-1 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点号	监测点位	时段	声级值 dB（A）	标准值 dB(A)	评价	工况
2025 年 3 月 13 日	N1	东场界外 1m，高 1.2m 处	昼	55.3	60	达标	正常
			夜	46.6	50	达标	正常
	N2	南场界外 1m，高 1.2m 处	昼	57.7	60	达标	正常
			夜	48.7	50	达标	正常
	N3	西场界外 1m，高 1.2m 处	昼	56.9	60	达标	正常
			夜	42.3	50	达标	正常
	N4	北场界外 1m，高 1.2m 处	昼	57.5	60	达标	正常
			夜	46.7	50	达标	正常
2025 年 3 月 14 日	N1	东场界外 1m，高 1.2m 处	昼	55.8	60	达标	正常
			夜	46.7	50	达标	正常
	N2	南场界外 1m，高 1.2m 处	昼	56.5	60	达标	正常
			夜	47.2	50	达标	正常
	N3	西场界外 1m，高 1.2m 处	昼	57.2	60	达标	正常
			夜	43.0	50	达标	正常
	N4	北场界外 1m，高 1.2m 处	昼	56.7	60	达标	正常
			夜	46.4	50	达标	正常

10 环境管理检查

10.1 环保管理机构

芜湖保颂房地产开发有限公司环境管理由公司安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

10.2 施工期环境管理

本工程在施工招标文件中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。

10.3 运行期环境管理

芜湖保颂房地产开发有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

10.4 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

10.5 环评批复落实情况检查

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于其中“三十六、房地产”，“106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的“不涉及环境敏感区”的，无需开展环境影响评价工作。

11 验收监测结论

11.1 环境保护设施调试结果

2025 年 3 月 13 日~2025 年 3 月 14 日各减噪设备及防护设施运行正常。项目验收监测期间，昼间最大噪声 57.7dB（A），夜间最大噪声 48.7dB（A）；项目四周噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准，噪声可达标排放。

11.2 结论

1、项目建设内容

芜湖保颂房地产开发有限公司“保利文华和颂府小区项目”设计占地面积 173092.06m²，总建筑面积约 151199.7m²；目前实际共建成 1 栋 18F 住宅楼、2 栋 22F 住宅楼、1 栋 10F 洋房，6 栋 11F 洋房，1 栋 1F 公共设施楼及 3 处-1 地下车库；总建筑面积 94371.43m²，其中住宅面积 66799.81m²，配套商业用房面积 546.48m²，配电房面积 166.05m²，物业管理用房面积 517.08m²，消防控制室面积 60.78m²，地下车库面积 26281.23m²；配套建设给排水工程、电气工程及室外道路地坪、景观绿化、室内外水电气管道等配套设施。该项目未设置卫生防护距离。暂无居民入住。

2、废水

项目废水主要来源于居民生活用水、公建配套用水。排水采用雨、污分流制。雨水汇集后排入市政雨水管网，生活污水经小区隔油池、化粪池处理达标后通过市政污水管网排入芜湖市城南污水处理厂处理集中处理达标后，排入漳河。

3、废气

项目运营期的废气主要来自进出车辆排放的汽车尾气、居民厨房油烟和燃用天然气排放的废气、生活垃圾产生的恶臭等。项目产生的汽车尾气，在地下车库采用机械通风和自然通风竖井处理，在地面停车楼四周种植绿化，减少尾气对四周大气的影 响。居民厨房油烟和燃用天然气燃烧的废气经小区内的预留烟道集中收集，并通过烟道由楼顶排入高空。项目产生的生活垃圾经小区内垃圾桶收集，做到日产日清，生活垃圾不在小区内停留超过一天。

4、噪声

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G1-3#楼、G5-6#楼、Y1#楼、Y2#楼、Y5#楼、P2#楼、P3#楼及地下车库一）竣工环境保护验收监测报告

项目噪声源有各类水泵与风机的机械噪声、汽车出入停车楼和地下车库的交通噪声、商业噪声等。主要产噪设备置于地下负一层专用设备房内。通过采取优化商业布局和各种隔声、吸声、降噪措施，加强对进出车辆噪声的管理等。

5、固废

项目营运期产生的固体废物主要为居民生活垃圾等。对这些垃圾实行袋装、分类收集，生活垃圾交环卫部门及时清运、日产日清；废包装材料等有用部分出售给专业收购人员综合利用。


6、结论

综上所述，本项目符合区域的产业定位，符合芜湖市总体规划；按照国家有关建设项目环境管理法律法规要求，无需开展环境影响评价工作，较好的执行了“三同时”制度，落实了“雨污分流”，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，项目所测得噪声排放均符合相关标准，建设内容符合规划许可相关的要求，建议通过“三同时”竣工环境保护验收。

11.3 建议

- （1）建立健全企业环境保护制度，对职工进行宣传教育，提高其环保意识；
- （2）做好污染防治工作，对各项污染防治设施进行定期维护并派专人进行操作和管理，确保各项污染物达标排放；
- （3）待后期居民入住后，补充废水、废气跟踪监测。

芜湖保颂房地产开发有限公司保利文华和颂府小区项目（其中 G1-3#楼、G5-6#楼、Y1#楼、Y2#楼、Y5#楼、P2#楼、P3#楼及地下车库一）竣工环境保护验收监测报告
附图一 现场监测图

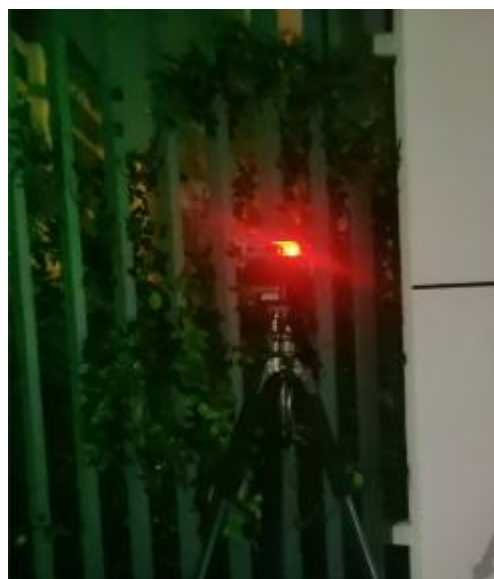

噪声监测

